



**BENDUNGAN NGLANGON**

# **PROGRES BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA**

**Semarang, 28 Februari 2022**

**Status 22.00**

---



# PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2022 PER BALAI




**eMONITORING ONLINE**  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Status: 28 Februari 2022

NO	BBWS/BWS/PUSAT/SKPD TPOP	Pagu (dlm ribuan)		Progres (dlm %)	
		DIPA	REALISASI	Keu	Fisik
1	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana	1.808.220.371	310.473.334	17,17	22,53
2	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak	1.975.571.392	336.154.146	17,02	28,60
3	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	1.339.499.448	187.277.457	13,98	13,44
4	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	1.033.018.902	128.981.729	12,49	14,38
5	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	1.757.376.446	124.009.468	7,06	9,68
6	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian	904.238.734	63.328.468	7,00	6,90
7	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	1.921.973.880	130.395.484	6,78	14,46
8	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	1.832.788.221	123.175.772	6,72	9,62
9	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	1.055.482.945	46.702.629	4,42	0,31
10	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang	1.363.747.982	25.184.991	1,85	4,40
11	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	1.260.582.886	17.532.087	1,39	9,41
12	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	720.586.869	2.654.522	0,37	0,35

# GRAFIK PROGRES BBWS SDA PUPR

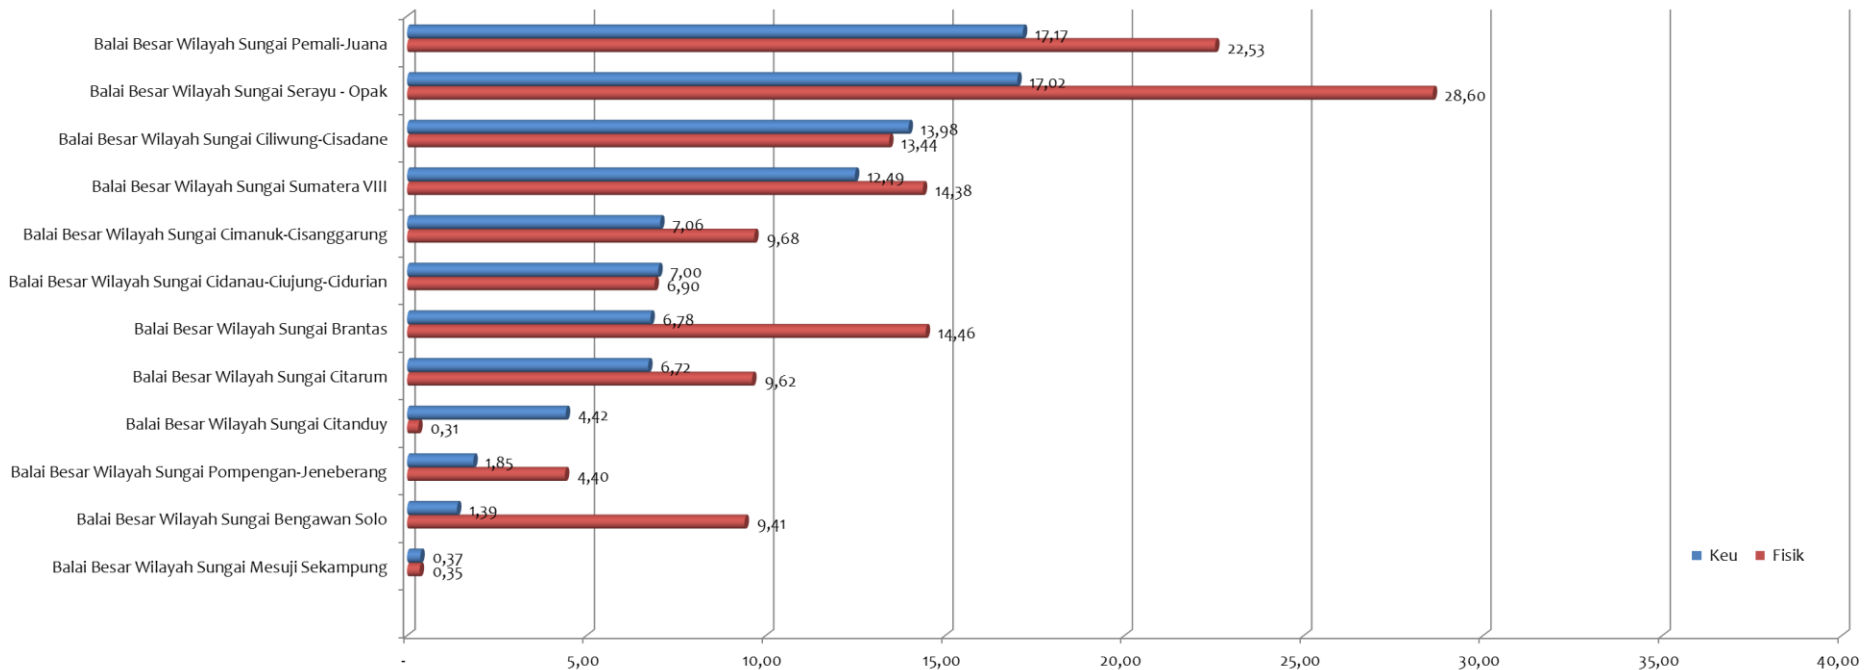

# Progress Fisik dan Keuangan BBWS Pemali Juana

periode  
**28 FEBRUARI 2022**

Total alokasi

**1.808.220.371**

418.484.249

102.882.625

519.899.561

226.665.914

454.406.349

85.881.673

Keu/Fis

**17,17% / 22,53%**

**SNVT BENDUNGAN**

**33,85% / 47,85%**

**SNVT PJPA**

**21,87% / 25,42%**

**SNVT PJSA**

**13,21% / 15,56%**

**Satker OPSDA**

**11,64% / 14,59%**

**SNVT ATAB**

**9,81% / 13,29%**

**Satker Balai**

**7,75% / 7,80%**

Total penyerapan

**310.473.334**

141.639.449

22.502.760

68.692.325

26.382.034

44.597.956

6.658.810

# PROGRES FISIK DAN KEUANGAN BBWS PEMALI JUANA PER PPK

periode  
**28 FEBRUARI 2022**



**eMONITORING ONLINE**  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	PPK	NAMA PPK	Pagu (dlm ribuan)	Progres (dlm %)	
				Keu	Fisik
1	PPK BENDUNGAN II	Rino Ariwibowo, ST, M.Eng	165.970.875	75,70	95,88
2	PPK IRIGASI DAN RAWA I	Heri Santoso, ST, M.PSDA	43.989.657	25,33	25,35
3	PPK OPSDA IV	Herdiana Kusumaningrum, ST, MT	53.743.384	22,84	22,85
4	PPK IRIGASI DAN RAWA III	Nugradi Dwi Isworo, ST	36.475.468	22,08	20,70
5	PPK SUNGAI PANTAI I	Fuad Kurniawan, ST, MT	110.822.938	16,18	28,05
6	PPK DSE	Lesty Arlensitami, ST, M.Eng	99.667.853	15,69	0,08
7	PPK IRIGASI DAN RAWA II	Kalmah, ST, M.Si, M.Sc	22.417.500	14,75	33,23
8	PPK TATALAKSANA	Joko Hadinoto Wijoyo, ST, MT	37.051.817	13,84	13,97
9	PPK SUNGAI PANTAI II	Dani Prasetyo, ST, MT	409.076.623	12,41	12,17
10	PPK AIR BAKU	Chanif, ST, MT	447.156.349	9,96	13,50
11	PPK PSDA	Mytta Hardani Dirgantari, ST	8.697.600	9,47	9,47
12	PPK OPSDA II	Rendra Arif Yudiarso, ST, MT	62.795.000	9,47	10,25
13	PPK OPSDA III	Agnes Yustikarini Dian Iswari, ST, MT	65.521.400	8,82	8,85
14	PPK OPSDA I	Muhamad Hendrie Soesanto, ST	44.606.130	5,34	19,20
15	PPK PAB (BMN)	Ali Rosidi, SE, MM	2.827.225	3,75	3,75
16	PPK PERENCANAAN DAN PROGRAM	Dewi Shinta Rulisyani, ST	37.305.031	1,61	1,61
17	PPK AIR TANAH	Pandu Yuri Pratama, ST, MPSDA	7.250.000	0,84	0,84
18	PPK PEMBINAAN DAN PERENCANAAN	Muchammad Arifin, ST, MT	35.602.128	0,51	29,97
19	PPK BENDUNGAN I	Wahyu Apri Yoga, ST, MT	117.243.393	0,16	25,91
<b>TOTAL</b>			<b>1.808.220.371</b>	<b>17,17</b>	<b>22,53</b>





**TERIMA KASIH ...**
